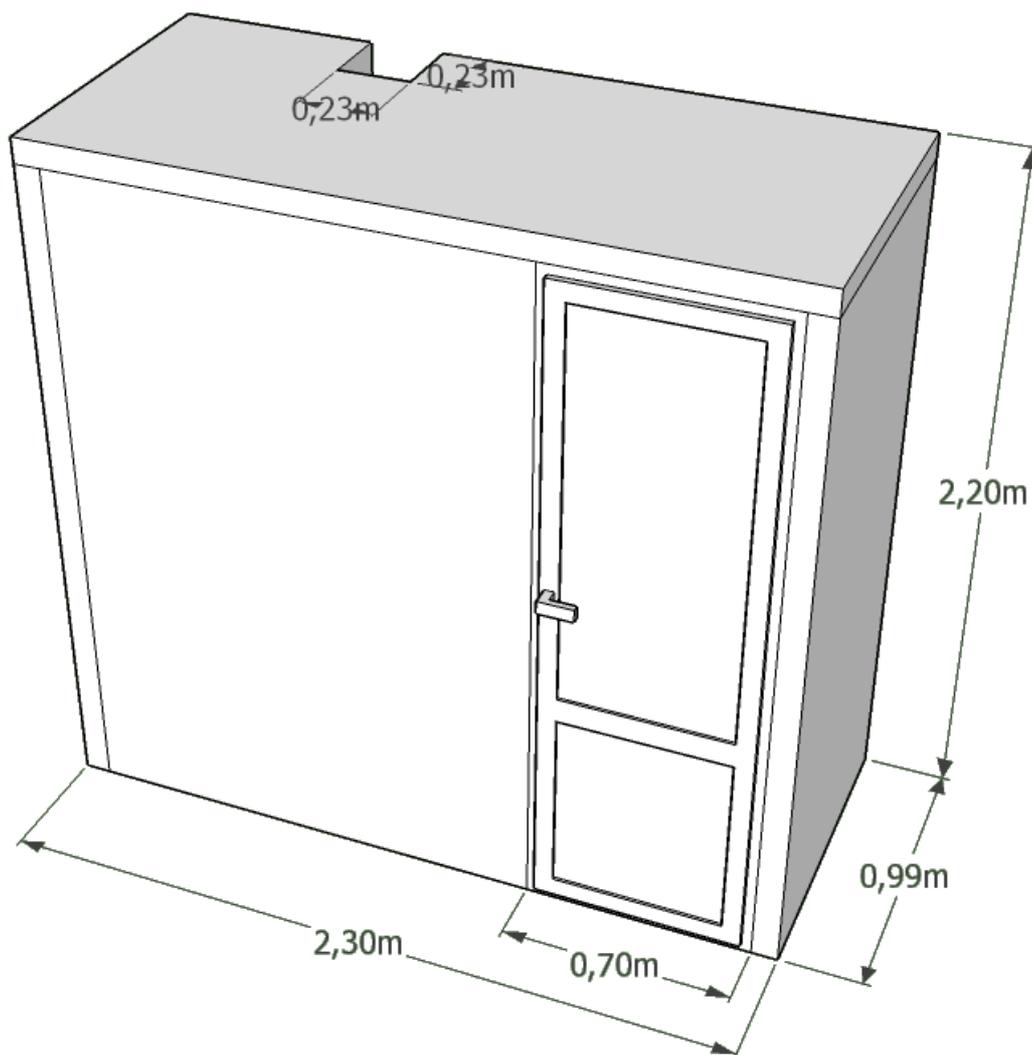


Коммерческое предложение.



Добрый день! Предлагаем рассмотреть вариант поставки камеры для хранения пива в кегах, с настраиваемым рабочим температурным режимом $+4^{\circ}\text{C} \dots +8^{\circ}\text{C}$.



- Визуализация камеры



Расчет стоимости холодильной камеры 13м³ (внутр.) (2300x990x2200мм):

Наименование и внешний вид	Технические характеристики	Кол-во	Стоимость (руб.)
	Стеновые, (мм): 1190x2120	6 шт.	29000
	Потолочные, (мм): 1190x990	2 шт.	
	Напольные, (мм): -	-	
	Покрытие: оцинкованная сталь		
	Толщина: 80мм		
	Цвет: Ral 9003		
	Состав: профиль с полимерным покрытием 30x30, 30x110, 30x82x30.	60 пог.м.	10800
	Цвет: Ral 9003		
	Монтажная пена	3 шт.	4000
	Герметик	5 шт.	
	Саморезы (упаковка 100шт.)	2 шт.	
	Дюбеля (упаковка 100шт.)	1 шт.	
	Крепежные элементы	1 компл.	
	Сверла	1 компл.	
	Назначение: использование в помещениях, требующих поддержания среднетемпературного режима	1 шт.	12900
	Толщина дверного полотна: 40 мм		
	Материал: пенополиуретан (PUR)		
	Размеры дверного блока с рамой: 700x2120мм		
	Комплект поставки: ручка открытия (наружная/внутренняя), замок (под ключ)		
	Тип агрегата: сборная холодильная машина	1 шт.	39000
	Назначение: создание и поддержание заданного температурного режима +4°C...+8°C		
	Объем холодильной камеры, (м ³): до 7		
	Напряжение, (В): 220		
	Гарантия: 12 месяцев		
	Описание: Компрессор, конденсатор, охладитель, контроллер, защита по высокому и низкому давлению. Максимальное энергопотребление 1кВт.		
	Доставка сэндвич-панелей, фасонных элементов, оборудования (в пределах МКАД)	1 усл.	4500
	Разгрузка доставленных материалов: включена в стоимость услуги, обеспечивается исполнителем.		
	Кол-во специалистов: 2	1 усл.	11800
	Сроки: 1 день		
	Фронт работ: - сборка камеры - подключение к сети питания 220В (включая кабель до 3м) - укладка трассы (до 3м) - монтаж и ввод в эксплуатацию холодильного агрегата - контрольное тестирование всех компонентов системы		
<ul style="list-style-type: none"> Срок поставки материалов и ввода камеры в эксплуатацию 5-7 рабочих дней 		Всего:	114000

