









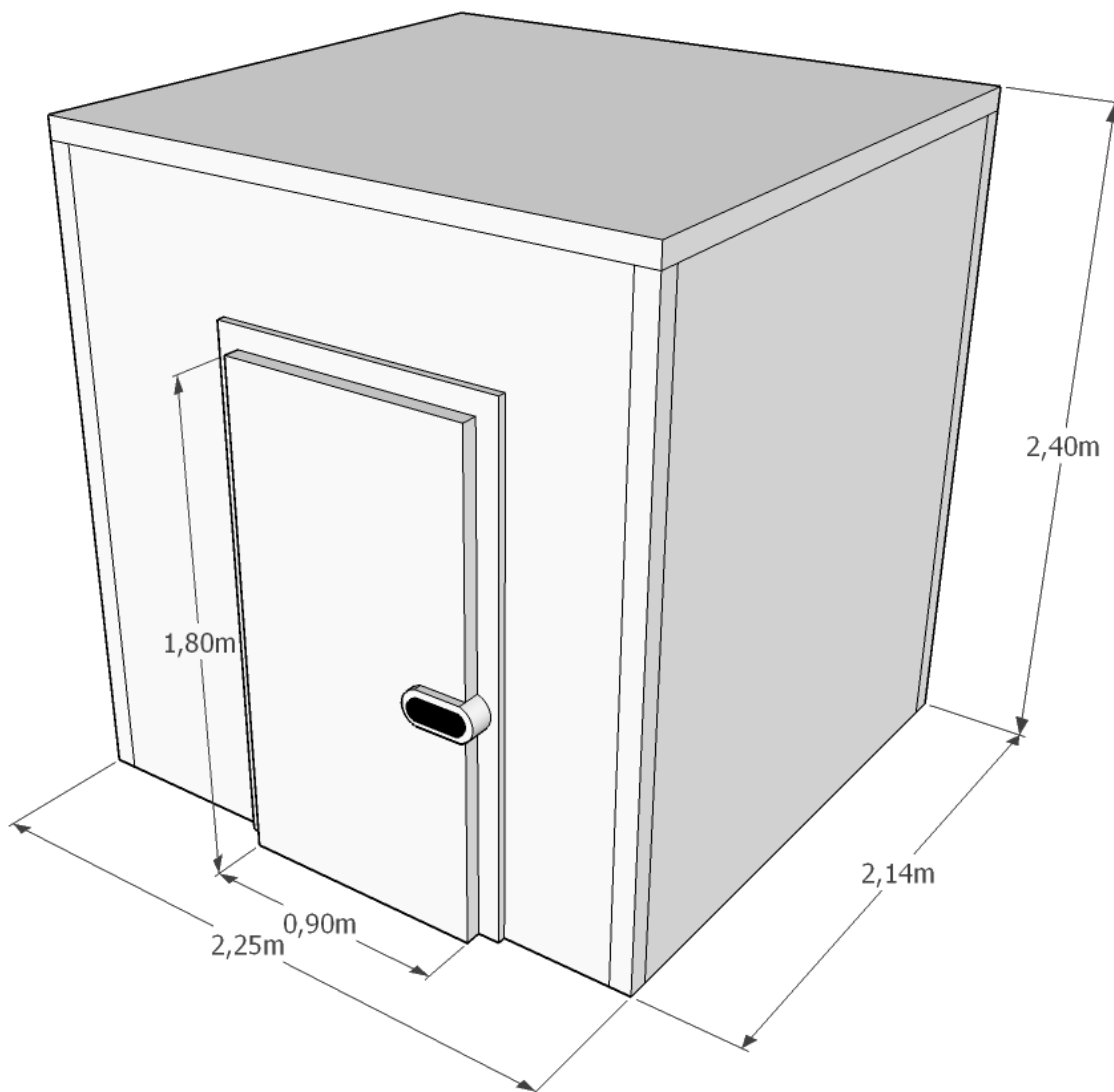



## Коммерческое предложение.

Добрый день! Предлагаем рассмотреть вариант сборки морозильной камеры, предназначенной для хранения предварительно замороженной продукции, при температуре  $-10^{\circ}\text{C}$ ... $-8^{\circ}\text{C}$



Морозильный склад 2250x2140x2400<sup>(h)</sup> / 9,2м<sup>3</sup>(внутр.)

Наименование	Характеристики	Кол-во	Цена (руб.)
<p>Сэндвич-панель пенополиуретан (PUR)</p> 	Стеновые 1185x2320мм	<b>8 шт.</b>	<b>59300</b>
	Потолочные 1185x2140мм	<b>2 шт.</b>	
	Напольные 1185x1980мм	<b>2 шт.</b>	
	Толщина 80мм		
	Покрытие холоднокатаная оцинкованная сталь, окрашенная полиэфирной краской Ral 9003, толщиной 0,5-0,7мм		
<p>Доборные элементы</p> 	Профильные изделия из листовой стали 40x40мм, 40x120мм, 40x82x40мм	<b>80 пог.м.</b>	<b>13600</b>
	Окрашены полиэфирной краской Ral 9003		
<p>Расходные материалы</p> 	Профессиональная монтажная пена	<b>3 шт.</b>	<b>4000</b>
	Герметик белый универсальный без запаха	<b>6 шт.</b>	
	Саморезы окрашенные в упаковке	<b>2 шт.</b>	
	Дюбеля в упаковке	<b>1 шт.</b>	
	Крепежные элементы, провода	<b>1 компл.</b>	
	Сверла	<b>1 компл.</b>	
<p>Дверь распашная одностворчатая</p> 	Использование в помещениях, требующих поддержания заданного температурного режима	<b>1 шт.</b>	<b>21700</b>
	Нагревательный элемент, для исключения примерзания (ПЭН)		
	Толщина дверного полотна 100 мм		
	Материал пенополиуретан (PUR)		
	Световой проем 900x1800мм		
	В комплект поставки входит крепление рамки к сэндвич панели с проёмом, петли, замок, внешняя и внутренняя ручка замка		
<p>Клапан выравнивания давления</p> 	Служит для предотвращения образования конденсата	<b>1 шт.</b>	<b>900</b>
<p>Освещение</p> 	Мощность 14Вт (эквивалент лампы накаливания 140Вт)	<b>4 шт.</b>	<b>2800</b>
	Свет холодный белый		
	Длина светильника 600мм		
	Световой поток 600Лм		
	Срок службы 30000ч		
	Работают при температуре 0°С...+45°С		
	Практически не выделяют тепло		
<p>Зимний комплект внешнего блока</p> 	Комплект предназначен для поддержания рабочего состояния внешнего блока агрегата в холодное время года	<b>1 шт.</b>	<b>9000</b>
	В состав комплекта входят: - регулятор скорости вращения вентилятора - ТЭН подогрева картера компрессора - дополнительный термодатчик - комплект проводов		
<p>Антивандальная защита</p> 	Обеспечивает защиту внешнего блока агрегата от нежелательного вмешательства и вандализма.	<b>1 шт.</b>	<b>5000</b>
	Защитный козырек предотвращает повреждения вызванные падением сосулек, снега, града.		
	Решетки обеспечивают беспрепятственное прохождение воздуха, необходимого для нормального охлаждения блока агрегата.		
<p>Polair SB211SF</p> 	Сплит-система	<b>1 шт.</b>	<b>61900</b>
	Поддержание заданной температуры в камере -10°С...-8°С		
	Напряжение 220В		
	Максимальное энергопотребление 1,15кВт		
	Габаритные размеры внутреннего блока 781x280x618мм		
	Габаритные размеры внешнего блока 990x315x704мм Гарантия 12 месяцев		

<p>Доставка</p> 	<p>Доставка крупногабаритным грузовым транспортом (в пределах МКАД)</p> <p>Разгрузка доставленных материалов обеспечивается исполнителем.</p>	<p><b>1 усл.</b></p>	<p><b>8000</b></p>
<p>Монтаж «под ключ»</p> 	<p>Кол-во монтажников: 4</p> <p>Продолжительность выполнения работ 5-7 дней</p> <p>Фронт работ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- укладка стеновых сэндвич панелей 8шт. – 1 усл.</li> <li>- укладка потолочных сэндвич панелей 2шт. – 1 усл.</li> <li>- укладка напольных сэндвич панелей 2шт. – 1 усл.</li> <li>- установка и регулировка дверного блока с РДО – 1 усл.</li> <li>- монтаж внутреннего блока сплит-системы – 1 усл.</li> <li>- монтаж внешнего блока сплит-системы – 1 усл.</li> <li>- укладка фреонотрассы (до 5м) – 1 усл.</li> <li>- вакуумирование – 1 усл.</li> <li>- установка зимнего комплекта оборудования – 1 усл.</li> <li>- установка антивандальной защиты – 1 усл.</li> <li>- монтаж светодиодных ламп (4шт.) – 1 усл.</li> <li>- настройка рабочих параметров системы</li> <li>- консультация по условиям эксплуатации</li> </ul>	<p><b>1 усл.</b></p>	<p><b>25000</b></p>
<p>• <i>Срок поставки материалов и ввода склада в эксплуатацию 10-12 рабочих дней</i></p>		<p><b>Всего:</b></p>	<p><b>211200</b></p>

