


Коммерческое предложение.

Добрый день! Предлагаем рассмотреть вариант установки холодильной камеры, предназначенной для хранения предварительного охлажденного пива в кегах, при температуре $+5^{\circ}\text{C} \dots +8^{\circ}\text{C}$.

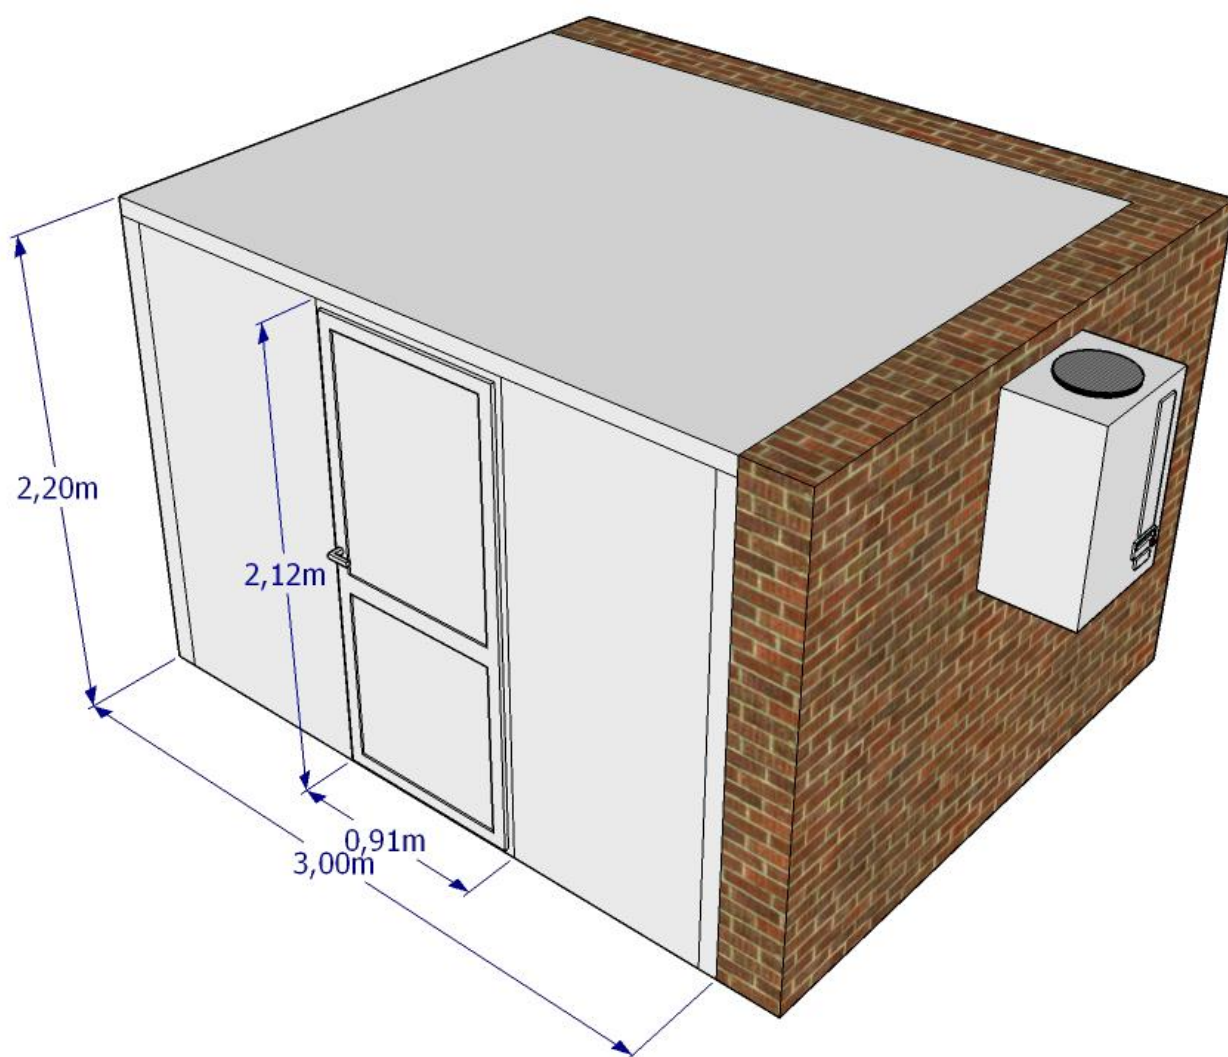

ООО "ПРОЕКТХОЛОД"
ИНН/КПП 7736312019 / 773601001
Адрес 117335, РФ, г. Москва, ул. Гарibaldi, д.15 к.3
Расчетный счет 4070281090000099347
БИК 044525555, ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», Кор. счет 3010181040000000555
Телефон +7(499) 990-53-07 zakaz@projectholod.ru

Холодильная камера +5°C...+8°C / 14м³ (внутр.)

Оптимальный вариант

Наименование	Характеристики	Кол-во	Цена (руб.)
<p>Сэндвич-панель пенополистирол (ППС)</p> 	Стеновые 1190x2420мм	9 шт.	45400
	Потолочные 1190x2500мм	3 шт.	
	Толщина 80мм		
	Покрытие холоднокатаная оцинкованная сталь, окрашенная полиэфирной краской Ral 9003, толщиной 0,5-0,7мм		
<p>Доборные элементы</p> 	Профильные изделия из листовой стали 30x30мм, 30x110мм, 30x82x30мм	70 пог.м.	9450
	Окрашены полиэфирной краской Ral 9003		
<p>Расходные материалы</p> 	Специализированная монтажная пена	2 шт.	4000
	Герметик силиконовый	3 шт.	
	Саморезы окрашенные в упаковке	2 шт.	
	Дюбеля в упаковке	1 шт.	
	Крепежные элементы	1 компл.	
	Сверла	1 компл.	
<p>Дверь распашная</p> 	Использование в помещениях, требующих поддержания заданного температурного режима	1 шт.	8500
	Толщина дверного полотна: 60 мм		
	Материал пенополиуретан (PUR)		
	Размеры двери вместе с рамой 900x2120мм		
	В комплект поставки входит замок под ключ, внешняя ручка замка		
<p>Холодильный агрегат Polair SM222SF</p> 	Сплит-система	1 шт.	71800
	Поддержание температурного режима (+5°C...+8°C)		
	Максимальное энергопотребление 1,65кВт		
	Напряжение 380В		
	Размеры внешнего блока 781x280x618мм		
	Размеры внутреннего блока 990x315x704мм		
	Трасса в комплекте поставки 5м		
	Вес брутто 145кг		
	Гарантия 12 месяцев		
<p>Доставка</p> 	Доставка крупногабаритным грузовым транспортом (в пределах МКАД)	1 усл.	4900
	Разгрузка доставленных материалов обеспечивается исполнителем.		
<p>Монтаж «под ключ»</p> 	Кол-во монтажников: 3		
	Продолжительность выполнения работ 2 дня		
	<p>Фронт работ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сборка объема камеры – 1 усл. - установка дверного блока – 1 усл. - монтаж внутреннего блока – 1 усл. - монтаж внешнего блока – 1 усл. - вакуумирование – 1 усл. - заправка фреоном – 1 усл. - укладка трассы (до 5м) – 1 усл. - подключение к сети 220В (включая укладку кабеля до 3м) – 1 усл. - монтаж и ввод в эксплуатацию агрегата - 1 усл. - контрольное тестирование всех компонентов системы – 1 усл. 	1 усл.	28750
<ul style="list-style-type: none"> • Срок поставки материалов и ввода камеры в эксплуатацию 5-7 рабочих дней 		Всего:	172800



Холодильная камера +5°C...+8°C / 14м³ (внутр.)

Экономичный вариант

Наименование	Характеристики	Кол-во	Цена (руб.)
<p>Сэндвич-панель пенополиуретан (PUR)</p> 	Стеновые 1500x2120мм	4 шт.	27700
	Стеновые 1210x2120мм	2 шт.	
	Стеновые 760x2120мм	2 шт.	
	Потолочные 2500x1500мм	2 шт.	
	Толщина 40мм		
	Покрытие пластик белого цвета, толщиной 1,5мм		
<p>Доборные элементы</p> 	Профильные изделия из листовой стали 30x30мм, 30x110мм, 30x82x30мм	75 пог.м.	10125
	Окрашены полиэфирной краской Ral 9003		
<p>Расходные материалы</p> 	Специализированная монтажная пена	2 шт.	4000
	Герметик силиконовый	3 шт.	
	Саморезы окрашенные в упаковке	2 шт.	
	Дюбеля в упаковке	1 шт.	
	Крепежные элементы	1 компл.	
	Сверла	1 компл.	
<p>Дверь распашная</p> 	Назначение: использование в помещениях, требующих поддержания заданного температурного режима	1 шт.	8500
	Толщина дверного полотна: 60 мм		
	Материал пенополиуретан (PUR)		
	Размеры двери вместе с рамой 900x2120мм		
	В комплект поставки входит замок под ключ, внешняя ручка замка		
<p>Сборная холодильная машина</p> 	Сборная бескорпусная холодильная машина	1 шт.	65000
	Создание и поддержание заданного температурного режима +5°C...+8°C		
	Объем холодильной камеры, (м ³): до 20		
	Напряжение 380В		
	Гарантия 12 месяцев		
	Комплект поставки: включает в себя зимний комплект оборудования, всепогодный защитный козырек, терморегулятор		
<p>Доставка</p> 	Доставка крупногабаритным грузовым транспортом (в пределах МКАД)	1 усл.	4900
	Разгрузка доставленных материалов обеспечивается исполнителем.		
<p>Монтаж «под ключ»</p> 	Кол-во монтажников: 3	1 усл.	28750
	Продолжительность выполнения работ 2 дня		
	Фронт работ:		
	- сборка объема камеры – 1 усл. - установка дверного блока – 1 усл. - монтаж внутреннего блока – 1 усл. - монтаж внешнего блока – 1 усл. - вакуумирование – 1 усл. - заправка фреоном – 1 усл. - укладка трассы (до 5м) – 1 усл. - подключение к сети 220В (включая укладку кабеля до 3м) – 1 усл. - монтаж и ввод в эксплуатацию агрегата - 1 усл. - контрольное тестирование всех компонентов системы – 1 усл.		
<p>• Срок поставки материалов и ввода камеры в эксплуатацию 5-7 рабочих дней</p>		Всего:	148975



ООО "ПРОЕКТХОЛОД"
ИНН/КПП 7736312019 / 773601001
Адрес 117335, РФ, г. Москва, ул. Гарибальди, д.15 к.3
Расчетный счет 40702810900000099347
БИК 044525555, ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», Кор. счет 30101810400000000555
Телефон +7(499) 990-53-07 zakaz@projectholod.ru
