


Коммерческое предложение.

Добрый день! Предлагаем рассмотреть вариант поставки холодильной камеры, предназначенной для хранения молочной продукции, с настраиваемым температурным режимом +2°C...+4°C




- Визуализация холодильной камеры

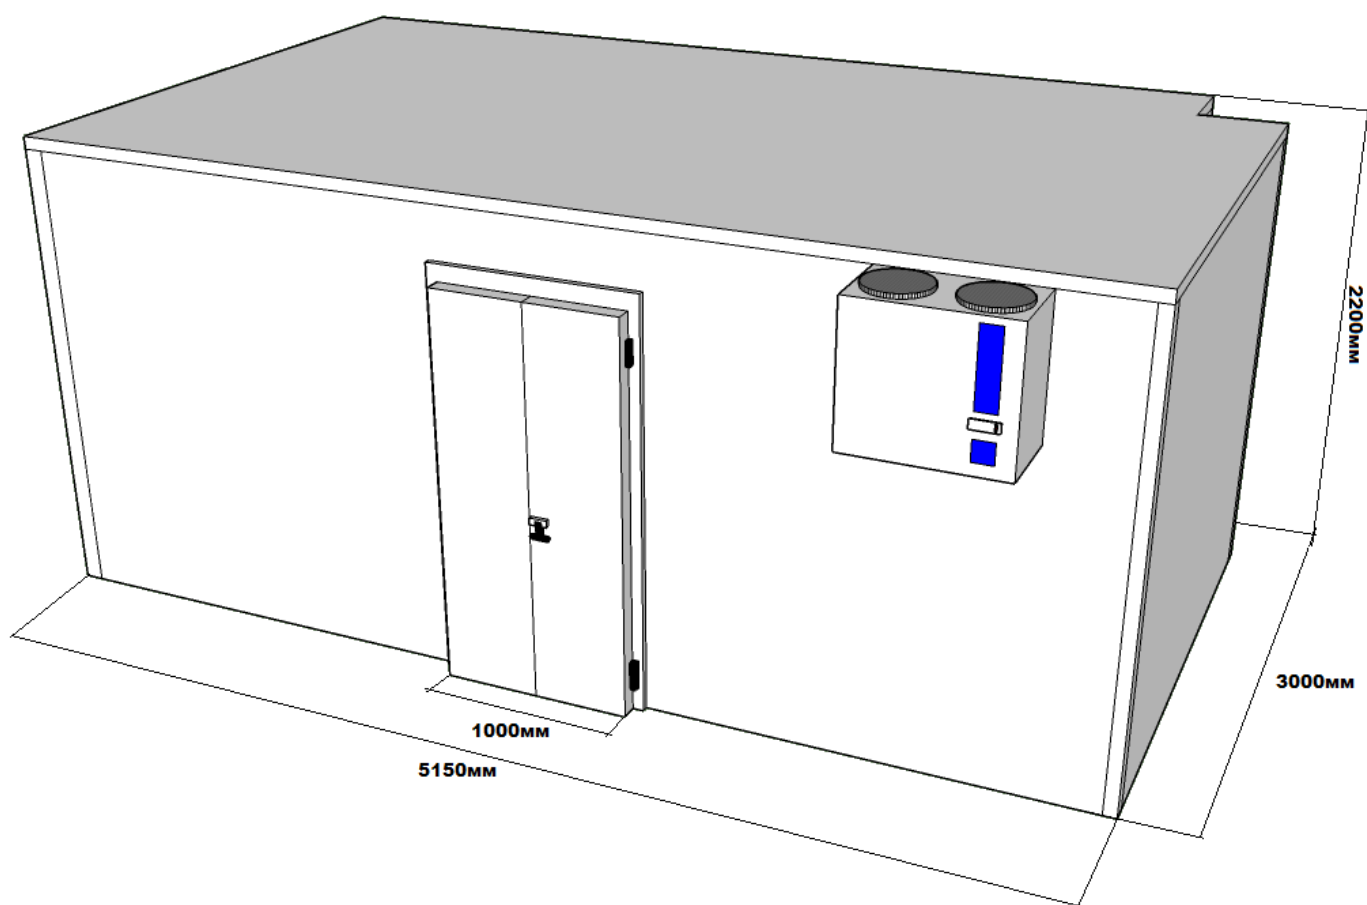

ООО "ПРОЕКТХОЛОД"
ИНН/КПП 7736312019 / 773601001
Расчетный счет 40702810900000099347
БИК 044525555, ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», Кор. счет 30101810400000000555
Телефон +7(499) 990-53-07 zakaz@projectholod.ru

Расчет стоимости холодильной камеры 30м³ (внутр.) (5150x3000x2200мм):

Наименование и внешний вид	Технические характеристики	Кол-во	Стоимость (руб.)
	Стеновые, (мм): 1185x2120	14 шт.	89100
	Потолочные, (мм): 1185x3000	5 шт.	
	Напольные, (мм): -	-	
	Покрытие: оцинкованная сталь 1,5мм		
	Толщина: 80мм		
	Расцветка (согласно каталогу расцветок Ral): 9003		
	Состав: профиль с полимерным покрытием 30x30, 30x110, 30x82x30.	90 пог.м.	12600
	Расцветка (согласно каталогу расцветок Ral): 9003		
	Монтажная пена	4 шт.	5500
	Герметик	7 шт.	
	Саморезы (упаковка 100шт.)	3 шт.	
	Дюбеля (упаковка 100шт.)	1 шт.	
	Крепежные элементы	1 компл.	
	Сверла	1 компл.	
	Назначение: использование в помещениях, требующих поддержания заданного температурного режима	1 шт.	36500
	Толщина дверного полотна: 80 мм		
	Световой проем, (мм): 1000x1800		
	Производитель: «ПрофХолод»		
	Комплект поставки: крепления рамки к сэндвич панели с проёмом, петли, замок, внешняя и внутренняя ручка замка		
	Тип агрегата: моноблок настенного типа	1 шт.	95900
	Назначение: поддержание заданного температурного диапазона +2°С...+4°С		
	Номинальное энергопотребление, (кВт): 2,05		
	Напряжение, (В): 380		
	Вес, (брутто, кг): 176		
	Размеры упаковки, (мм): 960x1260x1100		
	Гарантия: 12 месяцев		
	Доставка сэндвич-панелей, фасонных элементов, оборудования (до 5 км от МКАД)	1 усл.	4800
	Разгрузка доставленных материалов: включена в стоимость услуги, обеспечивается исполнителем.		
	Кол-во специалистов: 2	1 усл.	17000
	Сроки: 1 день		
	Фронт работ: - сборка камеры - установка и регулировка распашной двухстворчатой двери - монтаж и ввод в эксплуатацию холодильного агрегата - пуско-наладка холодильного агрегата		
<ul style="list-style-type: none"> Срок поставки материалов и ввода камеры в эксплуатацию 9-12 рабочих дней 		Всего:	261400

